



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO


Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia


ASST Gaetano Pini

ADEGUAMENTO AI REQUISITI DI SICUREZZA ANTINCENDIO DELLA SEDE DI PIAZZA CARDINAL FERRARI



Progettisti Associati Tecnarco s.r.l.

Milano - Via Lampedusa, 13
Tel. 02/45490600
Fax 02/45490601

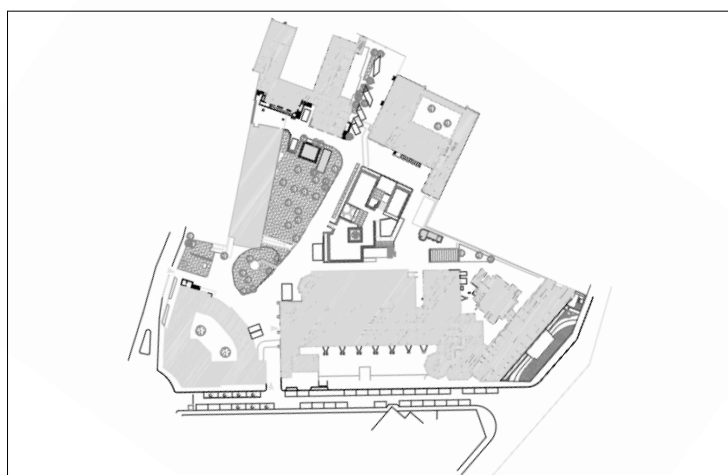

PROGETTO ESECUTIVO

Cronoprogramma


PROGETTO	FASE	EDIFICIO/AREA	CATEGORIA	SOTTOCATEGORIA	BLOCCO	PIANO	AMBITO	TIPOLOGIA	PROGRESSIVO	REVISIONE
2020605	PES	ENN	GEN	-	-	PNN	GE	CR	00005	00
REDATTO AA		VERIFICATO AC		APPROVATO AT			SCALA		DATA 25/05/2020	

direttore generale:
dott. Francesco Laurelli

responsabile unico del procedimento:
ing. Francesca Loreti

progetto architettonico:
arch. Andrea Taddia

progetto impianti meccanici ed elettrici:
ing. Roberto Taddia



	25/05/2020	Prima Emissione
Rev.	Data	Descrizione

DESCRIZIONE			mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5	mese 6	mese 7	mese 8	mese 9	mese 10	mese 11	mese 12
GG. PROGRESSIVI														
0	FASE 0 apprestamento generale del cantiere (area esterna)													
1	FASE 1 IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO													
	APPRONTAMENTO CANTIERE E SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI													
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	6245,62		3122,81			3122,81							
	SCAVI REINTERRI PER FONDAZIONI E ATTRAVERSAMENTI	1838,53		1838,53										
	FONDAZIONI IN C.A.	14908,86			7454,43	7454,43								
	COLLAUDO STRUTTURE													
	INSTALLAZIONE VASCHE	86662,47					43331,235	43331,235						
	MASSETTI E PAVIMENTI	7301,62						3650,81	3650,81					
	OPERE DA FABBRO	1867,35							1867,35					
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	24790,61					24790,61							
	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	146617,6					20945,37143	20945,37143	20945,37143	20945,37143	20945,37143	20945,37143	20945,37143	
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.													
2	FASE 2 ADEGUAMENTO FILTRI PIANO SETTIMO E OTTAVO													
	APPRONTAMENTO CANTIERE E SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI													
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2216,14		2216,14										
	OPERE STRUTTURALI	8332,9		8332,9										
	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	6001,59		6001,59										
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI COMPRESSE LE RIPRESE DELL'ESISTENTE	2778			2778									
	PROTEZIONI ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONI	24030,68				24030,68								
	SERRAMENTI INTERNI	14466,4				14466,4								
	TINTEGGIATURE	3453,95				3453,95								
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	18249,05				18249,05								
	IMPERMEABILIZZAZIONI ISOLAMENTI E CONTROSOFFITTI	25673,73				25673,73								
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.													
3	FASE 3 SOSTIRUZIONE PORTE REI													
	APPRONTAMENTO CANTIERE E SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI													
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	1143,68					381,2266667	381,2266667	381,2266667					
	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	1857,86					619,2866667	619,2866667	619,2866667					
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI COMPRESSE LE RIPRESE DELL'ESISTENTE	990,79					330,2633333	330,2633333	330,2633333					
	PROTEZIONI ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONI	6264,62					2088,206667	2088,206667	2088,206667					
	SERRAMENTI INTERNI	27148,32					9049,44	9049,44	9049,44					
	TINTEGGIATURE	1077,36					359,12	359,12	359,12					
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.													
4	FASE 4 NUOVI FILTRI PIANO SEMINTERRATO													
	APPRONTAMENTO CANTIERE E SPOSTAMENTI DEI SOTTOSERVIZI ESISTENTI													
	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	2878,15									2878,15			
	STRUTTURE IN ELEVAZIONE	5577,6									5577,6			
	SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI COMPRESSE LE RIPRESE DELL'ESISTENTE	737,37										737,37		
	PROTEZIONI ANTINCENDIO E COMPARTIMENTAZIONI	12282,69											12282,69	
	SERRAMENTI INTERNI	22252,66											22252,66	
	SERRAMENTI ESTERNI	1200,43											1200,43	
	TINTEGGIATURE	2580,75											2580,75	
	IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	37247,02										18623,51	18623,51	
	CONTROSOFFITTI	10016,38										5008,19	5008,19	
	COLLAUDI - PROVE FUNZIONALI - CERTIFICAZIONI PER RICONSEGNA AREA S.A.													
	TOTALE OPERE	528690,78												
	ONERI PER LA SICUREZZA	76309,22												
	Totale (euro)	605000												
	Produzioni parziali (euro x 1000)		0	17	3	86	59	34	36	21	29	45	83	0
	Produzioni progressive (euro x 1000)		0	17	19	105	164	198	233	254	284	329	412	412
